



PROVINCIA DI BRINDISI Comune di Brindisi



Progetto esecutivo relativo agli interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni mobili e di reperti (dipinti manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo studio delle tecniche di restauro

REGIONE PUGLIA
POR FESR 2014-2020




Asse VI

Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali

Azione 6.7

Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

"Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimoni culturale appartenente ad enti ecclesiastici"

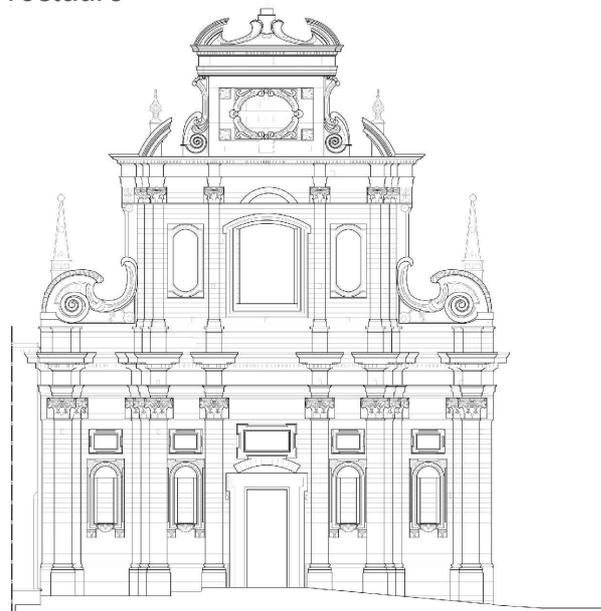

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni


Piazza Duomo 8- 72100 BR

RESPONSIBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

R.U.P.: Ing. Giorgio Rocco De Marinis

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA: Arch. Luigi Dell'Atti
Via Ancona 7
72027 San pietro Vernotico (BR)

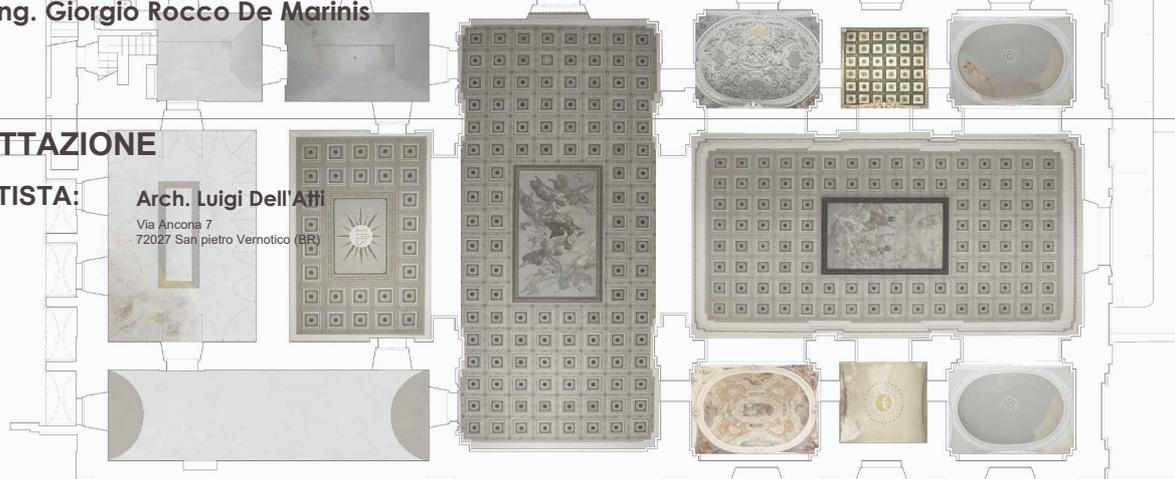

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA

FORMATO/SCALA

NOME FILE

ID. TAV.

CL

ALLEGATO "A"

Comune di BRINDISI

Provincia di BR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di beni mobili e di reperti (dipinti manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo studio delle tecniche di restauro

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni

CANTIERE: piazza Santa Teresa, BRINDISI (BR)

BARI, 30/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO DELL'ATTI LUIGI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE DE MARINIS GIORGIO ROCCO)

Nome attività	Durata	Gennaio 2018				Febbraio 2018				Marzo 2018				Aprile 2018				Maggio			
		25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	
MF1-ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	13 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z2 1																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z2 2																			
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di l	1 g	Z4 1																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z4 2																			
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z2 2																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z2 3																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g	Z1 4																			
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g	Z1 2																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso	13 g	Z2 13																			
MF1-DEMOLIZIONI	17 g																				
Rimozione di impianti	2 g	Z1 2																			
Demolizione di pareti divisorie	2 g	Z1 2																			
Rimozione di pavimenti interni	3 g	Z1 3																			
Rimozione di pavimenti su balconi e logge	4 g	Z1 4																			
Rimozione di massetto	4 g	Z1 4																			
MF2-SCAVI	6 g																				
Scavo a sezione obbligata	4 g	Z8 4																			
Scavo a sezione ristretta	2 g	Z8 2																			
MF4-REALIZZAZIONE DI TOMPAGNATURE E TRAMEZZATURE	10 g																				
Realizzazione di divisori interni	10 g	Z12 10																			
MF4-IMPIANTI	20 g																				
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	11 g	Z12 6																			
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ant	3 g	Z12 5																			
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g	Z9 3																			
MF4-OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	57 g																				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g	Z12 6																			
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g	Z12 4																			
Impermeabilizzazione di coperture	22 g	Z12 22																			
Posa di pavimenti per interni	7 g																				
Posa di pavimenti su coperture piane	8 g																				
Posa di rivestimenti interni	8 g																				
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g																				
MF4-RESTAURO PROSPETTO	35 g																				
Uso del ponteggio	35 g																				
Restauro prospetti esterni	35 g																				
MF4-INFISSI	4 g																				
Posa di serramenti interni	4 g																				
PARETI IN ACCIAIO E VETRO	14 g																				
Posa di serramenti interni	6 g																				
Montaggio di strutture verticali in acciaio	4 g																				
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	5 g																				
MF4-OPERE DA PITTORE	10 g																				
Tinteggiatura di superfici interne	6 g																				
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																				
OPERE DI RESTAURO ARTISTICO	130 g																				
Rimozione di depositi superficiali	27 g																				
Ristabilimento della coesione	34 g																				
Rimozioni di vecchie stuccature	37 g																				
Reintegrazione pittorica	32 g																				
ARREDI E SERVIZI	14 g																				
Posa di arredi	14 g																				
Smobilizzo del cantiere	4 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = MF1-Corpi A, B, e D																					
Z2 = MF1-Corte interna																					
Z3 = MF1-Corpo A																					
Z4 = Prospetto su via Crisanzio																					
Z5 = MF1-Copertura																					
Z6 = MF1-Corpi D																					

2018		Giugno 2018				Luglio 2018				Agosto 2018				Settembre 2018				Ottobre 2018				Novembre 2018							
07/05	14/05	21/05	28/05	04/06	11/06	18/06	25/06	02/07	09/07	16/07	23/07	30/07	06/08	13/08	20/08	27/08	03/09	10/09	17/09	24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	

Dicembre 2018			Gennaio 2019			Febbraio 2019			Marzo 2019			Aprile 2019			Maggio 2019			Giugno 2019										
26/11	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12	07/01	14/01	21/01	28/01	04/02	11/02	18/02	25/02	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04	22/04	29/04	06/05	13/05	20/05	27/05	03/06	10/06
